



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวนเงิน 278.5475 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 246.4825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 174.5375 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 104.0100 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 172.1793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.65 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 74.3032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.44 ตามลำดับ

สำหรับการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณภาพรวมทั้งสถาบัน จำนวนเงิน 270.7990 ล้านบาท จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 172.4777 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 98.3213 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างภาพรวมทั้งสถาบัน เป็นจำนวนเงิน 246.4825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.02 ค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 172.1793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 74.3032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.57 ตามลำดับ

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560) โดยสถาบันมีการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ จำนวนเงิน 278,547,500 บาท จัดหาโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดที่สุด คือ วิธี e-bidding จำนวน 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 จำนวนเงิน 202,720,213.22 บาท รองลงมาตามลำดับคือ วิธี เจาะจง จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.79 จำนวนเงิน 9,378,762.06 บาท วิธีคัดเลือก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.03 จำนวนเงิน 59,840,000.00 บาท และสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวนเงิน 11.2917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.05% ของงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร (ผลการเบิกจ่ายเงินไม่รวมงบลงทุนที่ขอเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี)

ทั้งนี้ สถาบันได้ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ แต่ในการ

ดำเนินการจัดหาพัสดุ ยังคงประสบปัญหาอุปสรรค ทำให้บางรายการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามสัญญา สรุปได้ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

1. ความพร้อมด้านต่างๆ
 - 1.1 สถานที่ก่อสร้าง เช่น การส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง
 - 1.2 แบบรูปรายการของสิ่งก่อสร้าง มีการปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่
 - 1.3 รายละเอียดคุณลักษณะค่าครุภัณฑ์ มีการปรับ/เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การใช้งานมีความทันสมัยมากขึ้น
 - 1.4 การจัดทำคำของบประมาณประจำปี เป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอาจจะไม่ทันสมัย บริษัทจำหน่ายอาจเลิกการผลิต และการหาคู่เทียบ 3 รายค่อนข้างยาก เนื่องจากบริษัทไม่มั่นใจว่าจะได้รับการคัดเลือกในการให้บริการสินค้า
2. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความยากในการตีความ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง กองกฎหมาย สำนักงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบัติ
3. ด้านกระบวนการ
 - 3.1 การวางแผนการทำงาน (ก่อน-หลัง) การจัดลำดับความสำคัญของรายการที่มีความสำคัญเร่งด่วน วงเงินสูง ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อ/จ้าง
 - 3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
 - เครื่องมือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เมื่อมีการปิดปรับปรุงระบบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ไม่มีระบบสำรอง
 - วิธีการ จัดหาบางวิธีการใช้ระยะเวลา เช่น e-bidding
 - ผู้จำหน่ายสินค้าหรือซัพพลายเออร์ หากจัดหาจากต่างประเทศใช้ระยะเวลานาน ทำสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามมาตรการที่กำหนด
 - 3.3 การบริหารสัญญา
 - การเร่งรัดงวดงาน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา/ปรับแผนการดำเนินงาน
 - การเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามงวดงาน
 - การกักหน้ผูกพันงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 - 3.4 การติดตามและรายงานผล
 - เครื่องมือ ขาดระบบการติดตามและรายงานผลแบบ real time
 - การรายงานความก้าวหน้ายังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 - 3.5 การกันเงินเหลือมือปี เอกสาร หลักฐานในการประกอบการดำเนินการไม่คล่องตัว

ผลกระทบ

1. ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/สัญญา
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
4. ไม่สามารถใช้งานได้ทันตามกำหนด เช่น เปิดภาคการศึกษาใหม่
5. ขาดโอกาสในการจัดสรรงบประมาณรายการผูกพันใหม่
6. มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการเชิญประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ให้รับทราบนโยบาย และการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และมอบหมายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เร่งรัดให้เป็นไปตามแผน และหรือเร็วกว่าแผน
2. กำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในสถาบันถือปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม ในการจัดทำคำขอของงบประมาณประจำปี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้รางวัลสำหรับส่วน งานที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผน
3. ปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ/การบริหารสัญญา กำหนดเงื่อนไขในการประมูล โดยให้เพิ่ม เงื่อนไข เช่น เป็นบริษัทที่มีผลกำไรต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี รวมถึงพิจารณาด้วยว่าบริษัทรับจ้าง ทำงานหลายโครงการหรือไม่ เนื่องจากบริษัทอาจมีค่างานไม่เพียงพอ ในการทำงานหลายโครงการ พร้อมกัน
4. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ สถาบันยังมีการป้องกันในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานทุกปี พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัด จ้าง และลงลายมือชื่อเพื่อแสดงเจตจำนงที่บริสุทธิ์และโปร่งใส ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเว็บไซต์ และเปิดช่องทางในการร้องเรียนได้

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย
งบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



เบิกจ่ายแล้ว 64 รายการ

ทันเงิน 2 รายการ

61⁺⁵ รายการ
รายการ

งบลงทุน
จำนวนทั้งสิ้น 278,547,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
จำนวนเงิน 174,537,500 บาท

ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
จำนวนเงิน 103,010,000 บาท

ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
(แผนงานยุทธศาสตร์)
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท


39⁺² รายการ
รายการ

21⁺³ รายการ
รายการ

1
รายการ

หมายเหตุ: + หมายถึง ใช้เงินเหลือจ่าย


รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (ITA)

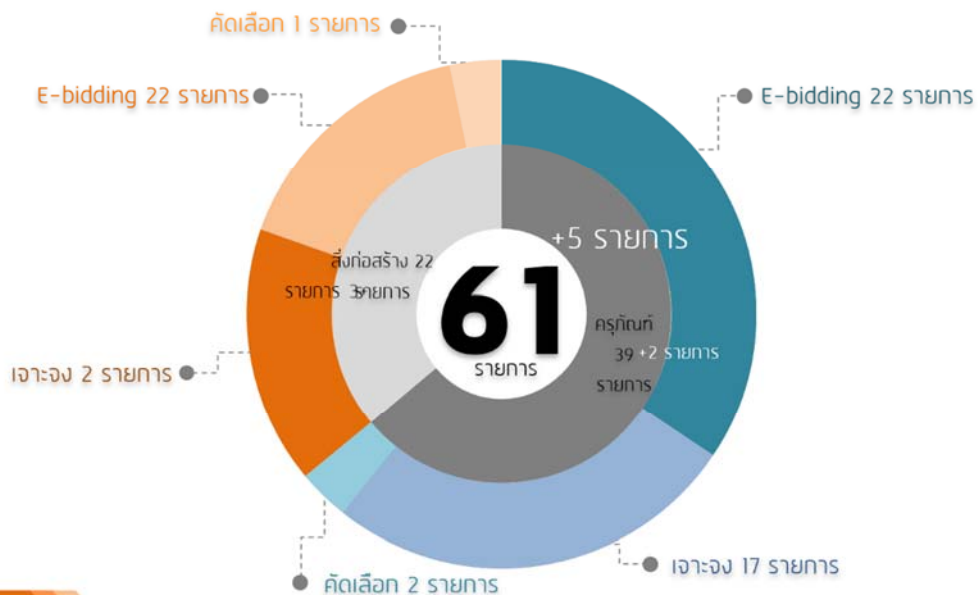

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับการเบิกจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA)



เบิกจ่ายจริงตามระบบทะเบียนคุมงบประมาณ

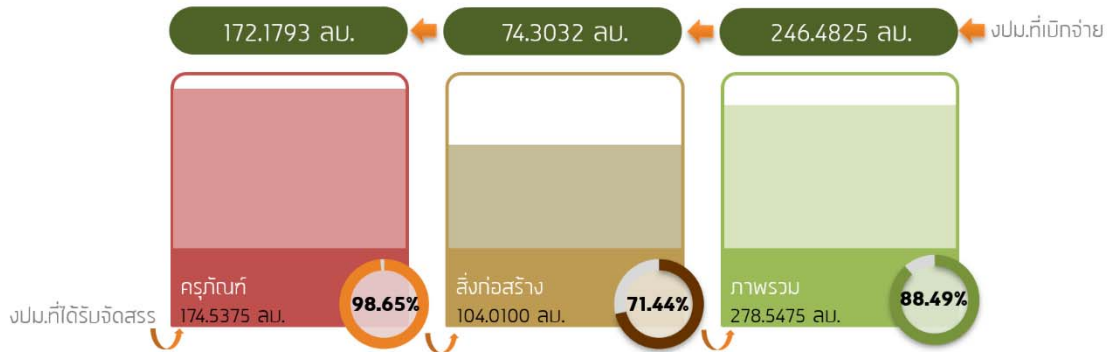


หน่วยนับ: ล้านบาท

เปรียบเทียบการท่อนี้กับการเบิกจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA)



เบิกจ่ายจริงตามระบบทะเบียนคุมงบประมาณ

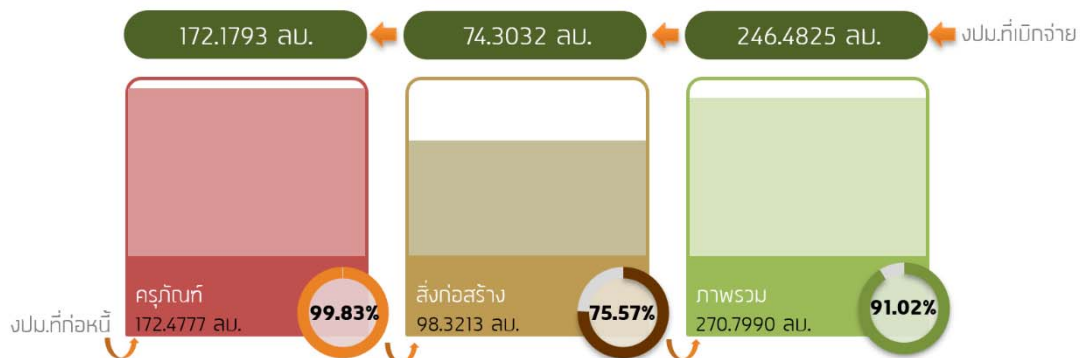

หน่วยนับ: ล้านบาท
